
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

Implementation of an SDN- and SD-WAN-Based Campus Network

Báo cáo tiến độ tuần 26/10 – 01/11/2026 · Đợt 10



Trần Hữu Nhân – 52300235
Nguyễn Nhật Hào – 52300198
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nội dung báo cáo

01 Mục tiêu đề tài & tuần

02 Kết quả thực hiện trong tuần

03 Công việc chưa hoàn thành

04 Kế hoạch tuần tới

01

Mục tiêu đề tài & tuần

Đề tài theo đề cương nhiệm vụ

Đề tài số 2 – Xây dựng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN
Implementation of an SDN- and SD-WAN-Based Campus Network · Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Nội dung đề cương → Hiện thực trong đồ án

Nội dung	Hiện thực	Trạng thái
Mô hình Core – Distribution – Access	Site 100: 2 Core IOL (VRRP), 2 Distribution + 4 Access OVS	Hoàn thành
VLAN theo khoa, phòng học, phòng máy, hành chính	VLAN 10 CNTT, 20 TTK, 30 Luật, 40 Hành chính, 90 Server Farm; VLAN riêng mỗi chi nhánh	Hoàn thành
SDN Controller quản lý switch	Ryu + OpenFlow 1.3 điều khiển 6 OVS, tự phục hồi, fast-failover	Hoàn thành
SD-WAN nối Campus chính với cơ sở phụ	Viptela: 4 chi nhánh, 2 đường Internet + MPLS, BFD/AAR	Hoàn thành
STP/RSTP, OSPF, DHCP, ACL, dự phòng liên kết	Rapid-PVST Core Site 100, STP chi nhánh, OSPF lõi, DHCP tập trung, ACL FW, Po/VRRP/FW HA	Hoàn thành

Mục tiêu và tiêu chí đánh giá theo đề cương

Mục tiêu

- Đơn giản hóa quản trị mạng Campus.
- Quản lý tập trung luồng dữ liệu giữa các khu vực.
- Tăng khả năng mở rộng khi thêm khoa hoặc cơ sở mới.
- Đảm bảo tính sẵn sàng cao cho dịch vụ đào tạo.

Tiêu chí đánh giá & số liệu hiện có

Tiêu chí	Đã có	Trạng thái
Thời gian thêm VLAN / khu vực mạng	Đã thêm Site 500, chưa bấm giờ	Chưa làm
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	SDN $<0{,}3$ s; SD-WAN ≈ 8 s; FW HA 11–21 s	Một phần
Hiệu năng giữa VLAN và cơ sở	Delay/jitter/mất gói 5 site; chưa đo throughput	Một phần
Tải trên Core và Distribution	Chưa đo	Chưa làm
Quản lý chính sách tập trung	vSmart, Ryu, NetOps Bot; chưa đo định lượng	Một phần

Các tiêu chí chưa đủ số liệu là trọng tâm của kế hoạch tuần tới.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI & TUẦN

Topology tổng thể

EVE-NG, chụp 01/11/2026


Site 100 – Campus chính: SDN (Ryu + 6 OVS), FW-ASAv HA qua SW-WAN-Edge1/2

Site 200/300/400 – chi nhánh Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang

Site 500 – cơ sở mở rộng

Site 900 – SD-WAN controller

Nhà cung cấp – Internet & MPLS chạy BGP

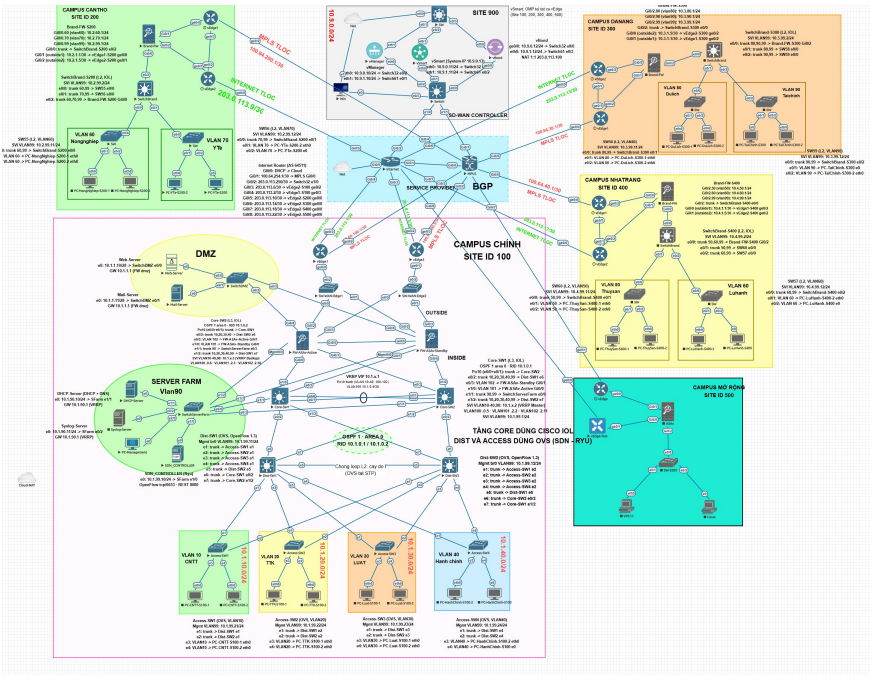

Nhiệm vụ đặt ra tuần trước và mức độ hoàn thành

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Đo lặp SD-WAN: failover link WAN, khôi phục controller, độ sẵn sàng	Một phần
2	Kiểm thử failover cặp FW-ASAv HA và VRRP trên Core	Hoàn thành
3	Hoàn thiện Site 500 (vEdge, switch, máy trạm, chính sách)	Hoàn thành
4	SDN: fast-failover cho uplink Distribution	Chưa làm
5	Theo dõi, thu bằng chứng khi vEdge mất kết nối	Hoàn thành
6	Đưa số liệu vào bản nháp báo cáo cuối kỳ	Chưa làm

Phát sinh thêm: kiểm thử chức năng toàn hệ thống đạt; đo lại hiệu năng 5 site sau khi thêm Site 500; **Campus NetOps Bot** (Telegram + AI agent) quản trị in-band Site 100 và 3 chi nhánh.

02

Kết quả thực hiện trong tuần

Tổng quan tiến độ theo hạng mục

Hạng mục	Nội dung	Trạng thái
Khảo sát & thiết kế	Lý thuyết SDN/SD-WAN, topology, bảng IP/VLAN/ASN	Hoàn thành
Hạ tầng campus L2/L3	Core/Distribution/Access, VRRP, FW-ASAv HA, ASDM	Hoàn thành
Chi nhánh 200/300/400	Brand-FW, DHCP, SwitchBrand, máy trạm	Hoàn thành
SD-WAN	Controller, PKI, vEdge, BFD, chính sách vSmart	Hoàn thành
SDN campus chính	Ryu, Console, 5 mục tiêu, fast-failover uplink Access	Hoàn thành
Site 500	2 vEdge, Brand-FW, SW-S500, máy trạm nhận DHCP	Hoàn thành
Kiểm thử & đo đạc	Chức năng đạt; failover FW HA, SD-WAN; còn tải, mở rộng	Đang làm
NetOps Bot	Giai đoạn 1–3: đọc, chẩn đoán, thay đổi có duyệt	Hoàn thành
Báo cáo & demo	Báo cáo tuần, bảng tiến độ; báo cáo cuối kỳ, slide bảo vệ	Đang làm

SD-WAN – Trạng thái fabric trên vManage (31/10)


Hostname	Device Model	Site ID	System IP	Health ⓘ	Reachability	vSmart Control	BFD	Up Since
vEdge1-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.1	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge2-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.2	✓	↑	2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 06:30 PM
vEdge1-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge2-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:21 PM
vEdge1-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:36 PM
vEdge2-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:25 PM
vEdge1-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge2-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 09:37 PM
vEdge1-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.1	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:57 PM
vEdge2-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.2	✓	↑	1 / 1	10 / 10	Oct 30, 2026 10:47 PM
vmanage	vManage	900	10.9.3.10	▲	↑	1 / 1	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vsmart	vSmart	900	10.9.0.13	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:54 PM
vBond	vBond (vEdge Cloud)	900	10.9.3.12	✓	↑	0 / 0	0 / -	Oct 25, 2026 07:57 PM

10/10
vEdge reachable, gồm 2 vEdge Site 500

3/3
controller vManage, vSmart, vBond

BFD đủ
Site 100: 16/16
chi nhánh: 10/10

SD-WAN – Các tunnel IPsec giữa các site

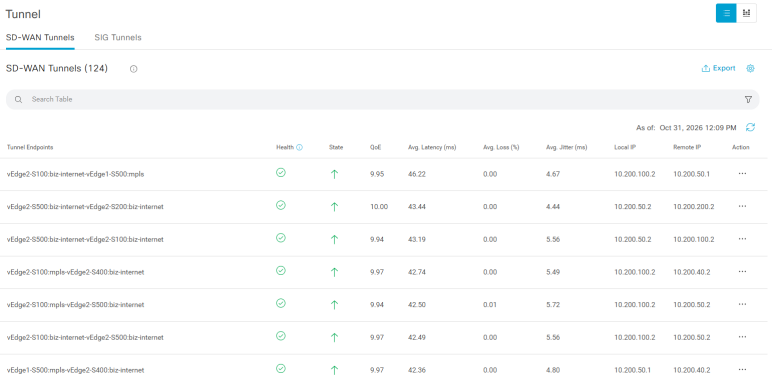

Tunnel

SD-WAN Tunnels | SIG Tunnels

SD-WAN Tunnels (124)

Export

Search Table

As of: Oct 31, 2026 12:09 PM

Tunnel Endpoints	Health	State	QoE	Avg. Latency (ms)	Avg. Loss (%)	Avg. Jitter (ms)	Local IP	Remote IP	Action
vEdge2-S100:biz-internet-vEdge1-S500:mpls			9.95	46.22	0.00	4.67	10.200.100.2	10.200.50.1	···
vEdge2-S500:biz-internet-vEdge2-S200:biz-internet			10.00	43.44	0.00	4.44	10.200.50.2	10.200.200.2	···
vEdge2-S500:biz-internet-vEdge2-S100:biz-internet			9.94	43.19	0.00	5.56	10.200.50.2	10.200.100.2	···
vEdge2-S100:mpls-vEdge2-S400:biz-internet			9.97	42.74	0.00	5.49	10.200.100.2	10.200.40.2	···
vEdge2-S100:mpls-vEdge2-S500:biz-internet			9.94	42.50	0.01	5.72	10.200.100.2	10.200.50.2	···
vEdge2-S100:biz-internet-vEdge2-S500:biz-internet			9.97	42.49	0.00	5.56	10.200.100.2	10.200.50.2	···
vEdge1-S500:mpls-vEdge2-S400:biz-internet			9.97	42.36	0.00	4.80	10.200.50.1	10.200.40.2	···

124
tunnel SD-WAN, gồm tunnel tới Site 500

2 màu
`biz-internet` và `mpls`

≈ 0 %
mất gói trung bình


SD-WAN – Failover link WAN tại Site 200

7,96 s
RTO trung bình (7,68 – 8,25 s), 2 lần đo

76,75 %
gói được khôi phục (PRR)


< 0,3 s
SDN fast-failover để so sánh

Chuyện gì xảy ra trong 8 giây?



- vEdge **chờ mất 7 gói BFD** mới kết luận tunnel chết ⇒ ≈ 8 s là **đúng cấu hình mặc định**.
- SDN nhanh hơn vì OVS **cài sẵn đường dự phòng**, không phải chờ phát hiện.
- Tuần tới: giảm chu kỳ BFD (vd. 300 ms) và đo lại.

SD-WAN – Hiệu năng Campus chính và chi nhánh (31/10)

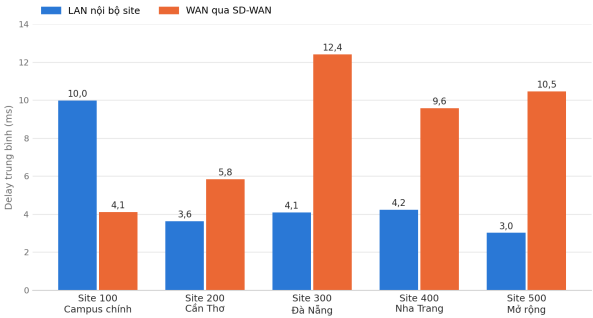

Site	Delay WAN	Jitter	Mất gói
100	4,1 ms	0,8 ms	0 %
200	5,9 ms	2,2 ms	0 %
300	12,4 ms	12,1 ms	0 %
400	9,6 ms	7,2 ms	0 %
500	10,5 ms	4,2 ms	0 %


- WAN qua SD-WAN **không mất gói** ở cả 5 site.
- Site 500 ban đầu chậm (LAN 18,6 ms) do vEdge chỉ 1 vCPU; nâng lên 2 vCPU ⇒ **3,0 ms**.
- Jitter Site 300/400 do vài mẫu RTT vọt 29–46 ms ⇒ cần đo lặp.

Firewall HA Site 100 – Thiết kế lại và đo failover (31/10)

Thiết kế mới

- **Inside:** transit VLAN 101/102 giữa FW và 2 Core; Port-channel Core thành trunk.
- **Outside:** 2 switch SW-WAN-Edge1/2, mỗi switch nối 1 vEdge ⇒ không còn điểm hỏng đơn.
- **OSPF** giữa FW và vEdge thay route tĩnh; FW kiểm tra interface mỗi 1 s.
- Sửa VRRP **split-brain**: đưa VLAN 10–40 lên trunk giữa 2 Core.

Kết quả: hỏng 1 switch WAN thì **Internet và liên site đều tự phục hồi**; trước đó Site 100 ↔ chi nhánh mất hẳn.

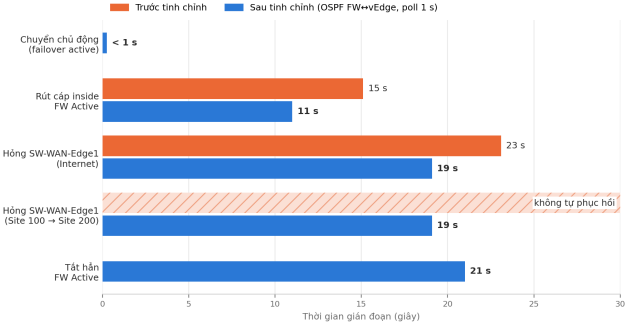


Ping liên tục từ VLAN 10 ra Internet và từ Server Farm tới Site 200 trong lúc gây sự cố.

Kiểm thử chức năng toàn hệ thống

Cụm	Kết quả	Đánh giá
SDN Site 100	6/6 OVS, 13/13 liên kết; 7/7 máy trạm nhận DHCP, thông liên VLAN	Hoàn thành
Firewall HA	Active / Standby Ready; failover tự động 4 kịch bản (slide trước)	Hoàn thành
SD-WAN	12/12 thiết bị reachable, BFD 92/92	Hoàn thành
Chi nhánh	9/9 VPC + 3 PC Linux nhận DHCP; dùng Web/Mail/DNS Site 100	Hoàn thành
Internet	4/4 site ra Internet có kiểm soát	Hoàn thành
Quản trị in-band	Từ Site 100 ping 15/15 IP quản trị chi nhánh; SSH 12/12 thiết bị	Hoàn thành

Campus NetOps Bot – Kiến trúc in-band

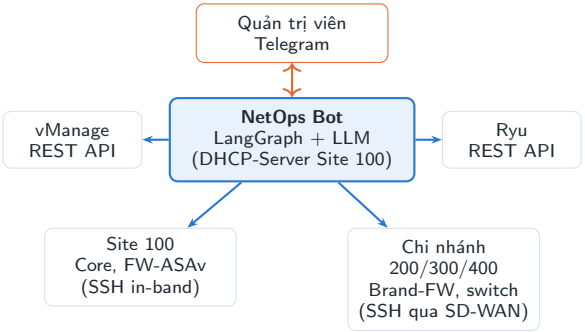

Ý tưởng

- Bot cài **ngay trong topology**: là một "người dùng" của mạng, mạng hỏng thì bot biết đầu tiên.
- Hỏi bằng lệnh hoặc **ngôn ngữ tự nhiên**; AI agent tự chọn công cụ (SSH, REST, DHCP).

Rào an toàn

- Chỉ trả lời chat được cho phép; mặc định chỉ lệnh đọc.
- Che mật khẩu/khóa trong kết quả.
- Tài khoản `netops` riêng, thiết bị chỉ nhận SSH từ 2 IP quản trị.

Campus NetOps Bot – Ba giai đoạn đã triển khai

GĐ1 – Chỉ đọc

- Danh mục 47 thiết bị khớp topology.
- `/show`, `/health`.
- Hỏi đáp tự nhiên qua AI agent.

GĐ2 – Chẩn đoán

- Tự báo Telegram khi vEdge mất kết nối, OVS rời controller.
- `/diag` **theo lớp**, dừng ở lớp đầu tiên sai.

GĐ3 – Thay đổi

- `/change`: duyệt trên Telegram rồi mới áp, **tự rollback**.
- `/compliance`, `/backup`, `/drift`.

Ví dụ `/diag site 400`: vEdge → WAN Brand-FW → gateway → trunk → DHCP. Bot phát hiện **lệch thiết kế có thật**: uplink 2 switch phòng ban Site 400 lên trunk nhờ DTP tự thỏa thuận ⇒ giữ lại làm kịch bản demo sửa bằng `/change`.

Campus NetOps Bot – Mở rộng ra chi nhánh & kiểm thử

Quản trị chi nhánh qua overlay SD-WAN

- 12 thiết bị (Brand-FW, SwitchBrand, 2 switch phòng ban × 3 site).
- Switch: user `netops`, SSH v2, ACL chỉ cho 2 IP quản trị.
- Brand-FW: AAA LOCAL, SSH chỉ từ 2 IP quản trị.
- Cấu hình lưu trên thiết bị và đồng bộ về kho mã nguồn.

23/23
selftest ĐẠT

71
unit test + kiểm cú pháp

15/15
IP quản trị chi nhánh

8/8
vEdge đạt cả 6 lớp chẩn đoán

03

Công việc chưa hoàn thành

Vấn đề còn tồn tại

Đo đạc theo tiêu chí đề cương

- Chưa đo **thời gian thêm VLAN / khu vực mạng**.
- Chưa đo **tải CPU, băng thông** trên Core và Distribution.
- Chưa đo **throughput** liên VLAN và liên cơ sở.
- Failover SD-WAN mới 2 lần tại 1 site; chưa đo mất vSmart.

Kỹ thuật & tài liệu

- SDN: mất liên kết Distribution – Core còn gián đoạn 2–3,7 s.
- vEdge 2 các site 100–400 còn 1 vCPU (chậm thêm ≈16 ms khi đi đường dự phòng).
- NetOps Bot chưa có rollback cho ASA; trunk Site 400 giữ lại để demo.
- Báo cáo cuối kỳ chưa bắt đầu bản nháp.

04

Kế hoạch tuần tới

Nhiệm vụ tuần tới (02/11 – 08/11): đo chỉ số hiệu năng

#	Chỉ số	Cách đo	Kết quả cần đạt
1	Thời gian khôi phục	SD-WAN: cắt 1 màu WAN, mất vSmart, lặp 3–5 lần/site, so BFD mặc định với 300 ms; FW HA lặp 3 lần; SDN thử fast-failover Distribution – Core	Bảng RTO min/TB/max, PRR theo thành phần
2	Hiệu năng liên VLAN & liên cơ sở	iperf3 TCP/UDP giữa các VLAN Site 100 và giữa các site; delay/jitter/mất gói; nâng vEdge 2 lên 2 vCPU rồi đo lại	Throughput, delay, jitter từng tuyến
3	Tải Core & Distribution	CPU, bộ nhớ, lưu lượng interface Core-SW1/2 và OVS (Ryu port stats) khi chạy tải iperf3	Biểu đồ tải theo mức lưu lượng
4	Thời gian mở rộng	Bấm giờ thêm 1 VLAN mới (Ryu + Core + DHCP) và thêm 1 site vEdge qua vManage	Số phút từ lúc bắt đầu đến khi máy trạm dùng được
5	Quản lý chính sách tập trung	Đổi 1 chính sách vSmart / luồng Ryu / lệnh `/change`: đo thời gian áp xuống toàn mạng	Thời gian lan truyền, số thiết bị chịu ảnh hưởng
6	Độ sẵn sàng	Theo dõi nhiều ngày từ công cụ web Site 900	Availability, MTTR, MTBF

Song song: đưa số liệu vào **chương kết quả của báo cáo cuối kỳ**. Đo SDN và SD-WAN không chạy đồng thời; mỗi kịch bản chụp trạng thái trước/sau làm bằng chứng.

Cảm ơn thầy đã lắng nghe!

Trần Hữu Nhân · Nguyễn Nhật Hào
